




Gesamtterminprogramm übergeordnet - Erneuerung WB
Terminplan mit Sperrungen



Version: 2.14 Stand: 22.03.2021 Bearbeiter rv, RR, TTH Dok. Nr: 1022.551.01-213

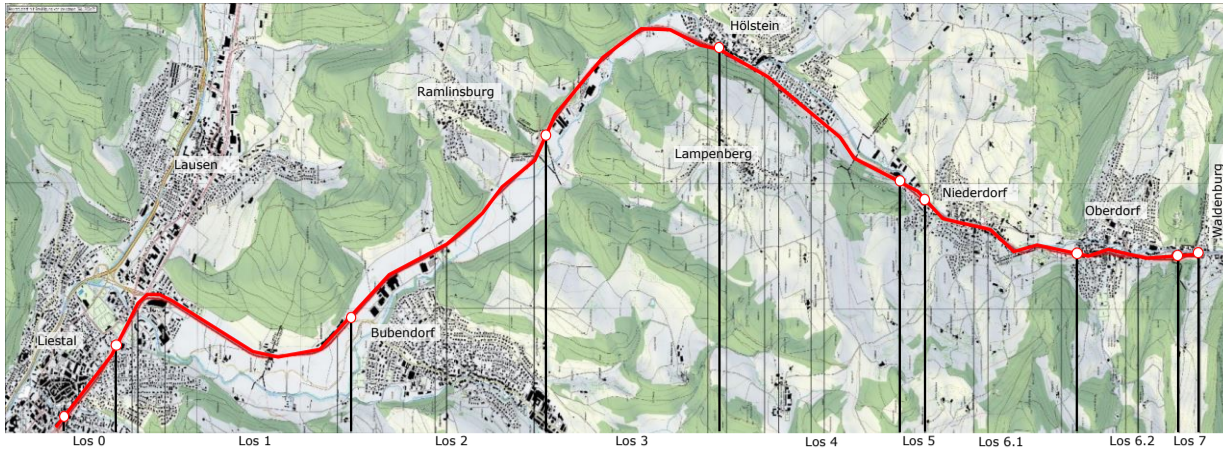

WB-Projekte	Bauzeit		2020												2021												2022												2023								
	von	bis	Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3																	
			Monate	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep																
Los 0 19.02.20	30.04.19																																														
	01.04.19	31.05.19	Hauptarbeiten in Sperrung Trassebau																																												
	19.07.21	25.02.22	Burggraben / Frenkenbrücke Süd																																												
	04.01.21	16.07.21	Burggraben / Frenkenbrücke Nord																																												
	26.07.21	17.12.21	25.07.22																																												
	25.07.22	18.09.22	Übergabe Trasse																																												
	20.09.22	10.12.22	Sicherungsanlagen																																												
	01.01.23	28.02.23	Testbetrieb																																												
Los 1 19.02.20	erhalten		PGV Los 1 erhalten																																												
	17.06.20	17.08.20	Vertrag, Admin, AVOR																																												
	01.11.20	02.04.21	Baumeister unter Betrieb																																												
	06.04.21	02.05.21	Wasserleitung, Fahrleitung																																												
	03.05.21	28.03.22	Unterbau Trasse																																												
	16.10.21	20.01.22	Gleisbau																																												
	21.01.22	31.03.22	Fahrleitung																																												
	01.04.22	30.06.22	Sicherungsanlagen																																												
Los 2 16.04.20	erhalten		PGV Los 2 erhalten																																												
	23.05.20	22.07.20	Vertrag, Admin, AVOR																																												
	01.11.20	02.04.21	Wasserleitung, Inst.plätze																																												
	06.04.21	02.05.21	Rückbau Fahrleitung																																												
	03.05.21	29.10.21	Unterbau Trasse																																												
	08.10.21	05.11.21	Gleisbau Abteilgleise																																												
	29.10.21	30.01.22	Übergabe Trasse																																												
	01.04.22	01.07.22	Sicherungsanlagen																																												
Los 3.1 17.02.21	erhalten		PGV Los 3.1 erhalten																																												
	23.05.20	22.07.20	Vertrag, Admin, AVOR																																												
	01.11.20	02.04.21	Inst.plätze, Werkleitungen																																												
	06.04.21	02.05.21	Rückbau Fahrleitung																																												
	03.05.21	29.10.21	Unterbau Trasse																																												
	08.10.21	05.11.21	Gleisbau																																												
	29.10.21	30.01.22	Übergabe Trasse																																												
	01.04.22	01.07.22	Sicherungsanlagen																																												
Los 3.2 15.02.21	erhalten		PGV Los 3.2 erhalten																																												
	23.05.20	22.07.20	Vertrag, Admin, AVOR																																												
	01.11.20	02.04.21	Inst.plätze, Werkleitungen																																												
	06.04.21	02.05.21	Rückbau Fahrleitung																																												
	03.05.21	29.10.21	Unterbau Trasse																																												
	08.10.21	05.11.21	Gleisbau																																												
	29.10.21	30.01.22	Übergabe Trasse																																												
	01.04.22	01.07.22	Sicherungsanlagen																																												
Los 4 15.02.21	erhalten		PGV Los 4 erhalten																																												
	18.08.20	17.10.20	Vertrag, Admin, AVOR																																												
	03.08.21	26.03.22	Wasserleitung, Installationsplätze																																												
	06.04.21	02.05.21	Rückbau Fahrleitung																																												
	03.05.21	18.02.22	Unterbau Trasse																																												
	20.09.21	01.05.22	Gleisbau																																												
	02.05.22	30.06.22	Übergabe Trasse																																												
	01.07.22	30.09.22	Sicherungsanlagen																																												
Los 5 25.02.21	erhalten		PGV Los 5 erhalten																																												
	18.08.20	17.10.20	Vertrag, Admin, AVOR																																												
	01.11.20	02.04.21	Werkleitungen																																												
	06.04.21	02.05.21	Rückbau Fahrleitung																																												
	03.05.21	18.02.22	Unterbau Trasse																																												
	29.04.22	30.06.22	Gleisbau																																												
	01.07.22	28.09.22	Fahrleitung																																												
	03.10.22	10.12.22	Sicherungsanlagen																																												
Los 6.1 12.02.21	erhalten		PGV Los 6.1 erhalten																																												
	18.08.20	17.10.20	Vertrag, Admin, AVOR																																												
	01.11.20	02.04.21	Werkleitungen Dorfgrasse																																												
	06.04.21	02.05.21	Rückbau Fahrleitung																																												
	12.04.21	27.06.22	Unterbau Trasse																																												
	11.02.22	20.05.22	Gleisbau																																												
	23.05.22	15.07.22	Fahrleitung																																												
	03.10.22	10.12.22	Sicherungsanlagen																																												
Los 6.2 03.03.21	erhalten		PGV Los 6.2 erhalten																																												
	18.08.20	17.10.20	Vertrag, Admin, AVOR																																												
	15.03.21	05.04.21	Baumeister unter Betrieb																																												
	06.04.21	02.05.21	Rückbau Fahrleitung																																												
	09.04.21	19.11.21	Baumeisterarbeiten in																																												
	28.08.21	16.05.22	Gleisbau feste Fahrbahn																																												
	13.05.22	02.08.22	Fahrleitung																																												
	03.08.22	13.09.22	Sicherungsanlagen																																												
Los 7 25.01.21	erhalten		PGV Los 7 erhalten																																												
	18.08.20	17.10.20	Vertrag, Admin, AVOR																																												
	04.01.21	03.04.21	Baumeister unter Betrieb																																												
	06.04.21	02.05.21	Rückbau Fahrleitung																																												
	03.01.21	26.08.22	Arbeiten in Sperrung, inkl. Umgebungsarbeiten und Gebäude																																												
	30.06.21	07.04.22	Baumeister Tiefbau																																												
	15.03.22	06.05.22	Gleisbau																																												
	29.04.22	08.07.22	Fahrleitung																																												
Gleichrichter	09.03.20		GR Tbhäuser																																												
	20.07.20		GR Bärenmatten																																												
	20.07.20		GR Bachmatten																																												
Sicherungsanlagen	01.05.20		Vertrag, Admin, AVOR																																												
	01.04.22		GR Waldenburg																																												

Legende: Mellenstein Erhalt PGV Übergabe Trassehoheit Trasse fertiggestellt Baumeister Tiefbau Gleisbau (Oberbau)

Legende Strassensperren:
 LSA
 Umleitung Richtung Waldenburg
 Umleitung Richtung Liestal
 Umleitung irrelevant für FZB
 Verkehrsdienst

